

## 付替道路工事(その2) 施工状況



**R5付替道路工事(その6)**  
R6.3月～R7.2月  
進捗率：約51%

**R5付替道路工事(その3)**  
R5.12月～R6.11月  
進捗率：約78%

**R5付替道路工事(その2)**  
R5.12月～R6.11月  
進捗率：約63%

**鳥羽河内ダム本体工事**  
R5.10月～R10.4月  
進捗率：約10%

進捗状況はYouTubeでも紹介しています

三重県県土整備部  
YouTubeチャンネル



## 鳥羽河内ダム概略平面図

付替道路(鳥羽市道)  
L=5,840m, W=4.0m

**R6放流設備工事**  
R6.8月～R8.8月  
進捗率：約1%

**凡例**

- 完成済
- 施工箇所
- 未完成
- 現道


**今月の見どころはこれ!!**  
鳥羽河内ダム本体建設工事 掘削状況  
付替道路工事(その2) 施工状況  
付替道路工事(その3) 施工状況  
付替道路工事(その5) 施工状況

ダム班イメージキャラクター「ハだむくん」

今月から事業進捗状況の掲載を始めたよ

県土整備部イメージキャラクター「ちどりん」

## 付替道路工事(その3) 施工状況

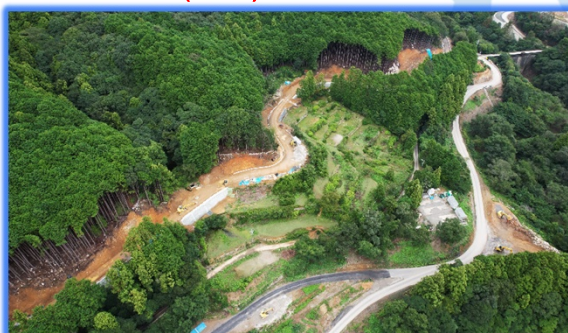

## 付替道路工事(その5) 施工状況



残土処分地

工事用道路兼付替道路  
L=1,060m W=5.0m

工事用道路  
L=2,630m W=4.0m~6.5m

**R5付替道路工事(その1)**  
R5.10月～R6.10月  
進捗率：約98%

**R5付替道路工事(その4)**  
R6.2月～R7.1月  
進捗率：約42%

**R5付替道路工事(その7)**  
R6.3月～R7.2月  
進捗率：約25%

**R5付替道路工事(その5)**  
R6.2月～R7.1月  
進捗率：約32%

## 付替道路全景 ダム建設位置より上流を望む



## 鳥羽河内ダム本体建設工事 掘削状況



## 鳥羽河内ダム本体建設工事 残土処分地

