


一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事の進捗状況について(平成27年6月末現在)

一般国道260号(木谷バイパス)の木谷トンネル(仮称)(延長433m)の工事進捗(平成27年6月末現在)について、お知らせします。


現在、平成27年12月の完成に向けて、平成26年10月より掘削をおこない、平成27年4月25日に起点側(志摩市側)へ貫通し、順次工事を進めています。

【工事内容】

- (1) 工事名：一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事
- (2) 工事箇所：志摩市浜島町南張～度会郡南伊勢町木谷地内
- (3) 工事概要：トンネル延長 433m、幅員 車道6.0m、全幅9.75m、
内空断面 56.8m²
- (4) 受注者：日本土建・稲葉建設・谷口建設特定建設工事共同企業体
- (4) 工期：平成26年6月27日～平成27年12月18日

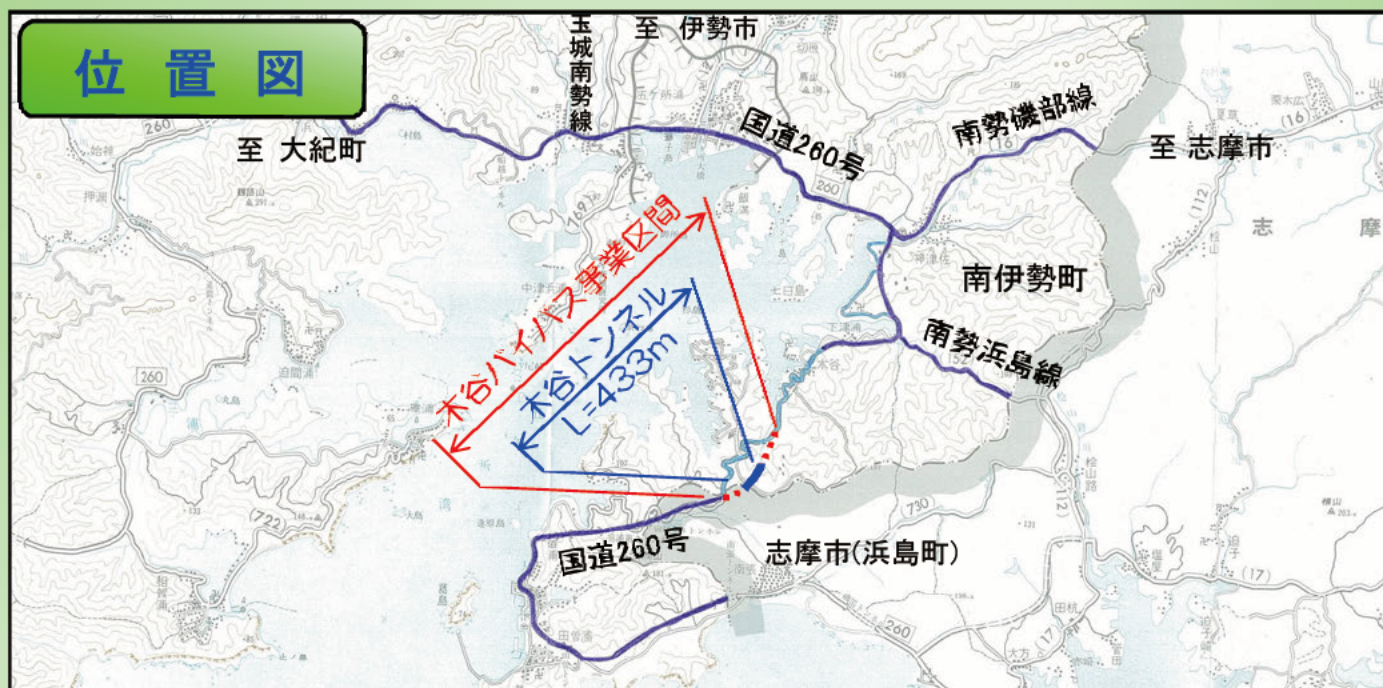

トンネル工事の進捗

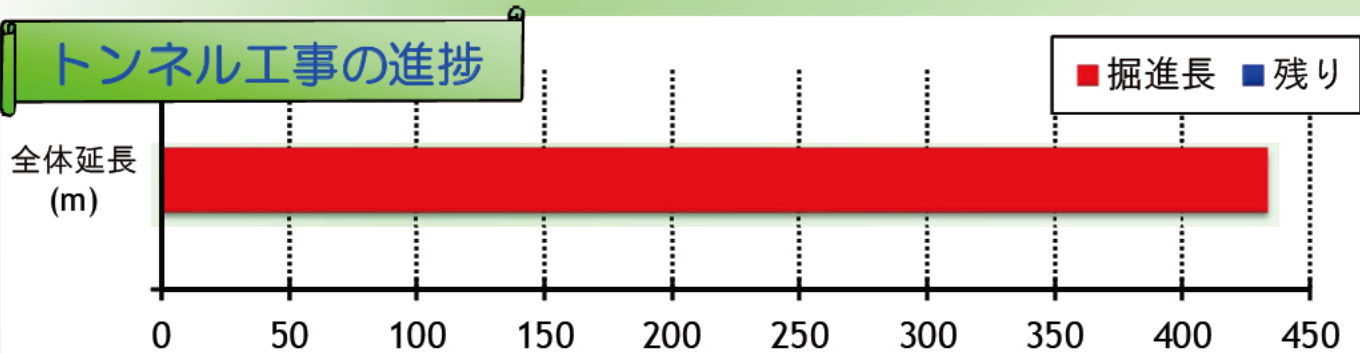

| 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 掘進長(m) | 300/433 | 385/433 | 433/433 | 433/433 | 433/433 |
| 掘削進捗(%) | 69 | 89 | 100 | — | — |
| 工事進捗(%) | 42 | 50 | 59 | 68 | 73 |

現場風景



<トンネル作業状況>

終点側（南伊勢町側）の坑口では、
坑門工の作業が完了しました。

現場風景

起点側坑口の状況



< 終点側付近 >
排水工等の作業を行っています。

< 起点側付近 >
覆工の作業を行っています。

