


一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事の進捗状況について(平成27年10月末現在)

一般国道260号(木谷バイパス)の木谷トンネル(仮称)(延長433m)の工事進捗(平成27年10月末現在)について、お知らせします。


現在、トンネル掘削が完了し、平成27年12月の完成に向けて、順次工事を進めています。

【工事内容】

- (1) 工事名：一般国道260号(木谷バイパス)道路改良(木谷トンネル(仮称))工事
- (2) 工事箇所：志摩市浜島町南張～度会郡南伊勢町木谷地内
- (3) 工事概要：トンネル延長 433m、幅員 車道6.0m、全幅9.75m、
内空断面 56.8m²
- (4) 受注者：日本土建・稲葉建設・谷口建設特定建設工事共同企業体
- (5) 工期：平成26年6月27日～平成27年12月18日

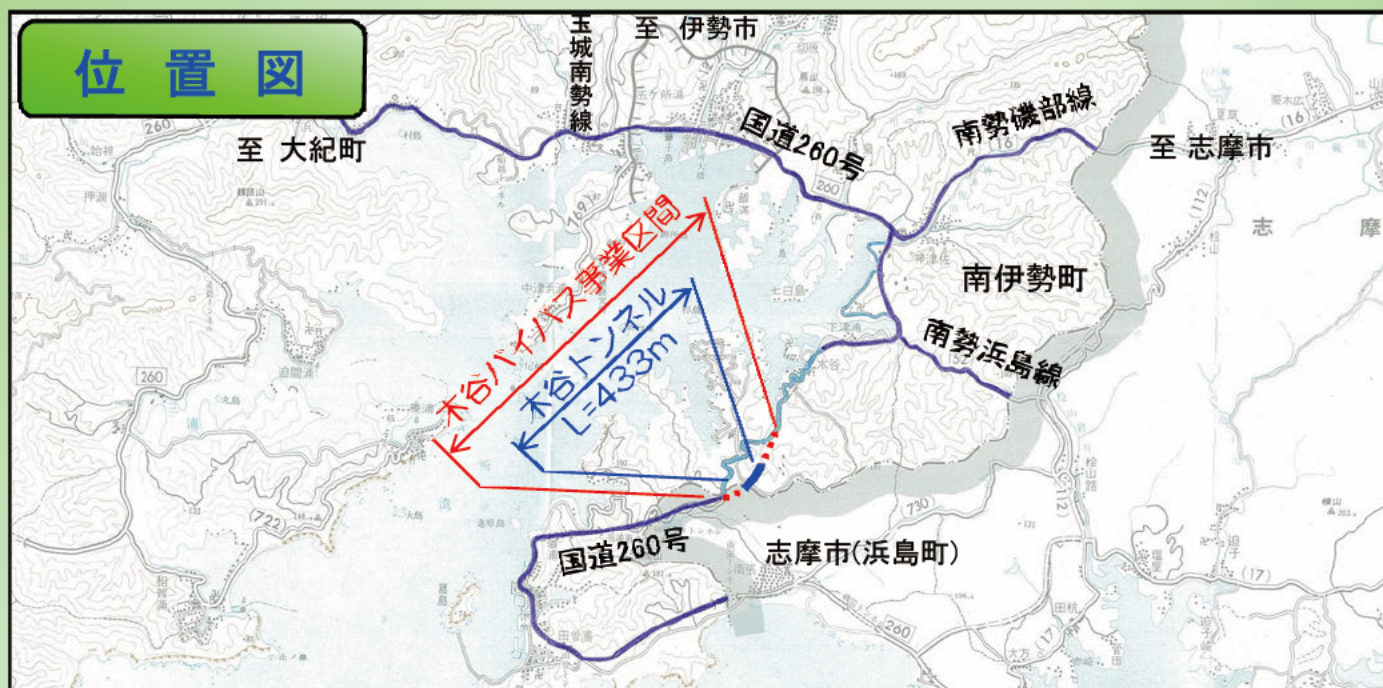

トンネル工事の進捗

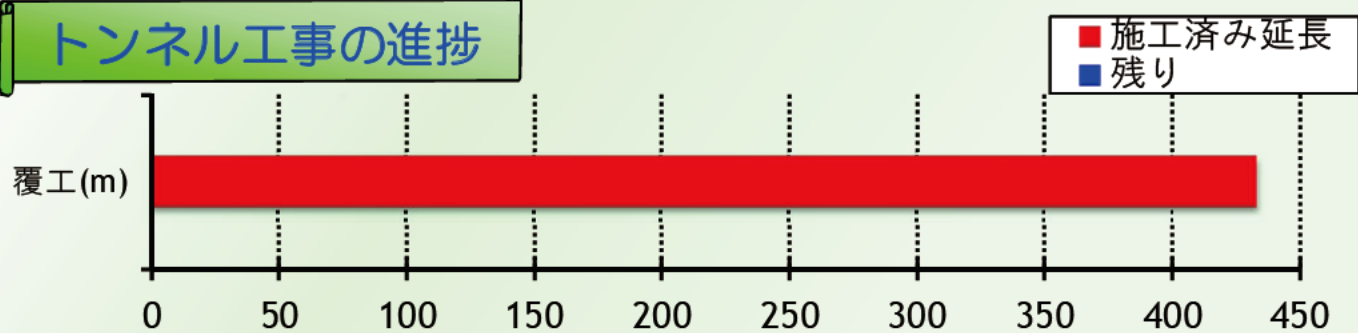

月	6月	7月	8月	9月	10月
覆工長(m)	216/433	321/433	427/433	433/433	433/433
覆工進捗(%)	49	74	98	100	100
工事進捗(%)	73	80	86	92	95

※平成27年4月25日に起点側（志摩市側）へ貫通
残る作業は舗装工、法面工、排水工となりました。

現場風景



<終点側坑口の状況>

坑門工の作業が完了し、法面工等の作業を行っています。

現場風景

＜起点側坑口の状況＞



＜終点側付近＞
舗装工の作業を行っています。

＜起点側付近＞
舗装工の作業を行っています。

