

東日本大震災からの復旧・復興に係る派遣業務報告

平成30年 2月13日

伊勢農林水産事務所 農村基盤室

番 一晴

# 1.被災地での業務概要

## 勤務地

宮城県 仙台地方振興事務所

水産漁港部 漁港漁場班 (平成28年4月1日～29年3月31日)

水産漁港事務所(塩釜市内)

(仙台地方振興事務所管内図)



災害復旧工事、新規整備工事の起工  
監督員業務 など



# 2-1.被災地での業務概要

## 荒浜漁港 災害復旧ロードマップ(平成30年度に完了)

区分	復旧工程								被害額 (査定額：百万円)	
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
漁港	施工準備(構造設計等) 緊急対策			災害復旧工事						5,231
海岸		施工準備(構造設計等)				災害復旧工事			1,647	




2402 北導流堤



T.P.3.6 防潮堤



T.P.3.6 防潮堤(基礎地盤確認)

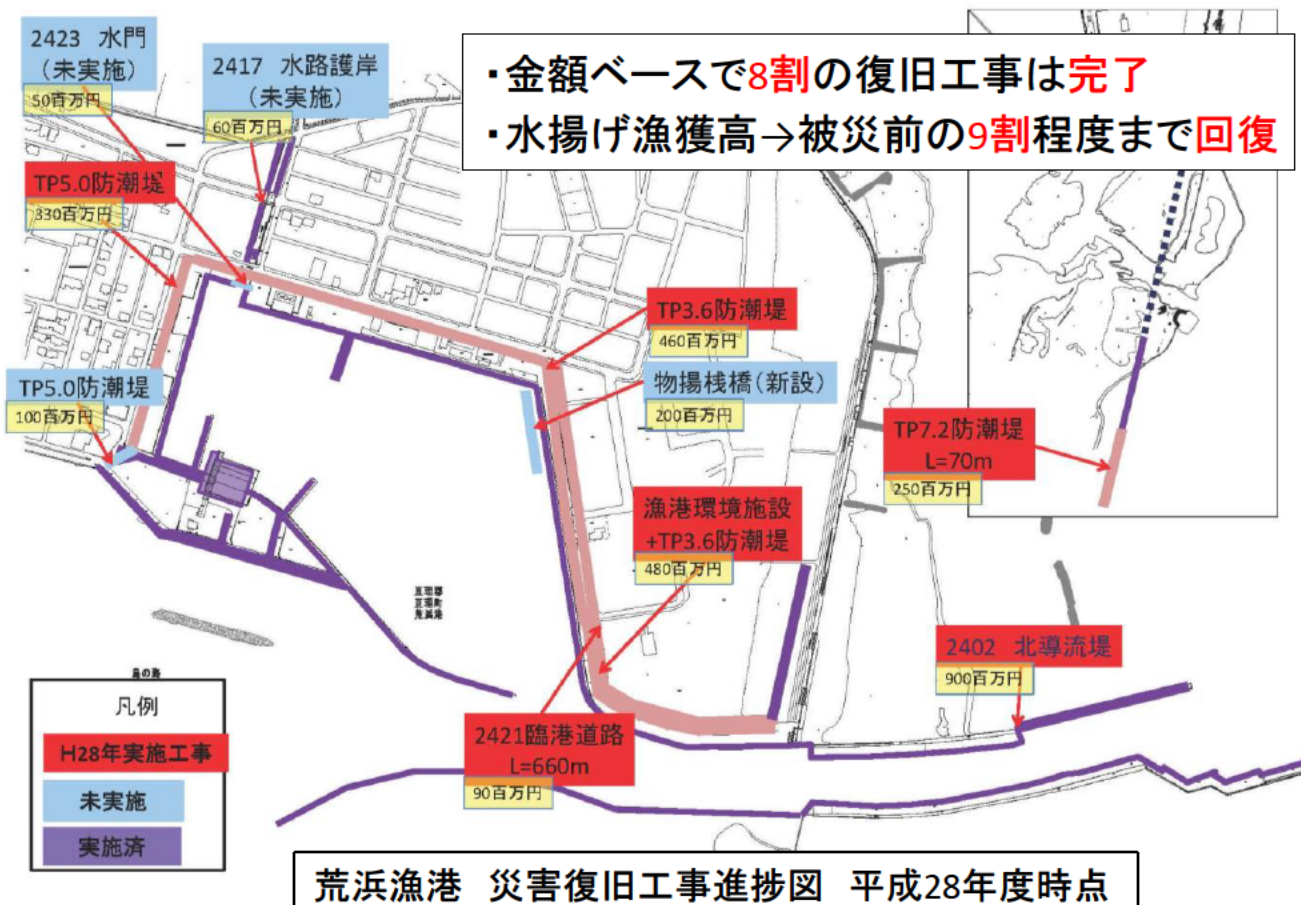

## 2-2.被災地での業務概要



### ■防潮堤については意見が分かれる。

#### 岸壁、市場

居住している人

- ・新鮮な魚

働いている人

- ・仕事・収入の回復

#### 防潮堤

居住している人

- ・命、財産を守る
- ・**景観が悪くなる**

働いている人

- ・**作業通行が制限、悪化**
- ・**景観悪化で観光に影響**

防潮堤の設計高さの考え方は県内統一  
粘り強く必要性を説明して同意を得る

#### 対策

- ・通行制限の解消→陸閘設置
- ・景観保持→アクリル板の設置

荒浜漁港では...

アクリル板の設置  
→地元の**同意**を得られた。



\*劣化防止シートにより不透過状態

# 3.派遣業務を通しての気づき

## 行政(宮城県)

災害対応 = 膨大な業務量

### 対策

- ・他県からの派遣の受入
- ・任期付職員の積極採用

### 課題

行政経験の無いor少ない職員  
→元建設業技術者が多い

業務遂行レベルの不均衡

得意:設計、現場監督等、技術的な仕事  
不得意:予算管理、地元調整等、行政的な仕事

### 現状

## 従来の事務分担 (地区別に分担)

地区名	A地区	B地区
業務内容	担当者	
地元協議	職員A	職員B
設計積算		
予算管理		
工事監督		

職員A  
…行政的な仕事得意  
職員B  
…技術的な仕事得意

### 対策案

## 経験やスキルに応じて分業 (業務別に分担)

地区名	A地区	B地区
業務内容	担当者	
地元協議	職員A	
設計積算		職員B
予算管理	職員A	
工事監督		職員B

一部地区で実施

職員間コミュニケーションが重要

定期的に工事の進捗状況や課題点等の共有が必要

ご静聴ありがとうございました。

大河原町 一目千本桜

