

## 第2編 土木工事編（積算基準（港湾関係）適用工事含む）

### 3. 週休2日交替制工事（発注者指定型）試行要領

#### （目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて、現場条件の制約や社会的要請等により、現場閉所が困難な工事においても、技術者及び技能労働者が適切に休日の確保ができるよう週休2日交替制工事（以下「週休2日（交替制）」という。）を試行する。

#### （定義）

第2条 週休2日（交替制）とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間<sup>※1</sup>として、対象者<sup>※2</sup>が「土曜日・日曜日」を問わず、交替制の勤務により4週8休以上の休日を確保するものをいう。

2 この要領において、月単位の週休2日（交替制）とは、対象期間内のすべての月毎で平均休日率<sup>※5</sup>が4週8休以上（8日/28日＝28.5%以上）であることをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）<sup>※7</sup>
- ・年末年始休暇（6日間）<sup>※7</sup>
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、月単位の週休2日（交替制）において、対象者の従事期間のうち、暦上の土曜日・日曜日が含まれない月は対象期間から除く。

※2 対象者とは、元請け及び施工体制に組み込まれた技術者<sup>※3</sup>及び技能労働者<sup>※4</sup>で、非常勤（臨時）で従事する者は除くものとする。

なお、対象期間内で連続して1週間程度以内の従事している者については確認の対象としない。また、交替要員を設定した場合は、交替要員は対象者としていない。

※3 技術者とは、施工管理を行い直接的な作業を行わない「現場代理人」・「監理（管理）技術者」・「下請主任技術者」等をいう。

※4 技能労働者とは、建設工事の直接的な作業を行う労働者をいう。

※5 平均休日率とは、対象期間内に現場に従事した対象者全員の休日率<sup>※6</sup>の平均値をいう。

※6 休日率とは、対象期間内に現場に従事した対象者の休日の取得率をいう。

※7 夏季休暇又は年末年始休暇は、工事の実態に合わせ取得するものとする。

（対象工事）

第3条 現場条件の制約等や社会的要請等により、現場閉所が困難な以下の工事の案件を対象とする。

- ① 工法等の制約により、連続施工が求められる工事
- ② 完成時期等の制約がある工事

ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第3編港湾等工事編を適用する。

- ① 契約期間が50日未満の工事
- ② 現場閉所・交替制のいずれも困難な工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「週休2日交替制工事（発注者指定型（月単位））」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 当初積算における週休2日（交替制）に関する経費は、月単位の週休2日（交替制）を前提とした補正係数（別紙1）を乗じたそれぞれの経

- 費（労務費、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。
- 2 月単位の週休2日（交替制）を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。
- 3 受注者は、月1回、対象者の休日確保状況を整理し、監督員に報告すること。

（工事成績評定における評価）

- 第6条 対象期間において、対象者全員の月単位の休日率が4週8休以上（28.5%以上）を達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。
- なお、対象者全員の月単位の休日率が4週8休以上（28.5%以上）及び月単位の週休2日（交替制）を達成出来なかった場合でも、工事成績評定の減点は行わない。

（現場代理人の休暇）

- 第7条 現場代理人が休暇で現場に不在の場合は、受注者は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保できる者を予め定めなければならない。

（施工計画書への明記）

- 第8条 第7条に基づき、受注者は、現場代理人が不在時の現場体制を施工計画書に明記することとする。
- なお、下記資料を施工計画書に添付することとする。
- ・第7条に基づき定めた者の直接雇用が確認できる資料


（現場閉所への変更）

- 第9条 工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休2日（交替制）から週休2日（現場閉所）に変更できるものとする。
- なお、週休2日（現場閉所）に変更した場合、週休2日制試行要領 第2編 港湾工事編「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」の試行要領に基づき実施するものとする。

（その他）

- 第10条 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※<sup>8</sup>が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示の例・サイズ】 A 3 横サイズ (297×420mm)

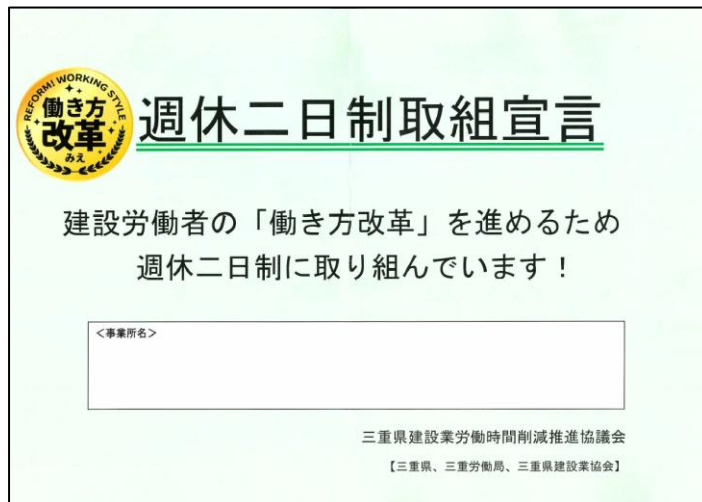

働き方改革

# 週休二日制取組宣言

建設労働者の「働き方改革」を進めるため  
週休二日制に取り組んでいます！

<事業所名>

三重県建設業労働時間削減推進協議会  
【三重県、三重労働局、三重県建設業協会】

【入手方法】

- ・ HP からダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

[https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039\\_00002.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm)

【三重労働局ダウンロードページ】

[https://jsite.mhlw.go.jp/mie-](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

[roudoukyoku/hourei\\_seido\\_tetsuzuki/roudoukijun\\_keiyaku/densisinsei\\_00001.html](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

- ・ 直接受け取る場合

【配付先】 厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・ 郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※8 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

附則 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年7月1日から施行する。

## 【別紙１ 補正係数】

月単位の週休２日（交替制）（４週８休以上）

- ・ 労務費                   ： １． ０ ２
- ・ 共通仮設費率       ： １． ０ ２
- ・ 現場管理費率       ： １． ０ ３

市場単価の経費補正については下記の補正係数を乗じる。

| 名称                         | 市場単価<br>補正係数 |
|----------------------------|--------------|
| 底面工                        | 1. 01        |
| マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） | 1. 00        |
| 支保工                        | 1. 02        |
| 足場工                        | 1. 01        |
| 鉄筋工                        | 1. 02        |
| 吊鉄筋工                       | 1. 02        |
| 型枠工                        | 1. 02        |
| コンクリート打設工（ポンプ車打設）          | 1. 02        |
| コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）        | 1. 02        |
| 止水板工                       | 1. 02        |
| 上蓋工                        | 1. 02        |
| 伸縮目地工                      | 1. 01        |
| 係船柱取付                      | 1. 02        |
| 防舷材取付                      | 1. 02        |
| 車止・縁金物取付                   | 1. 02        |
| 係船柱撤去                      | 1. 02        |
| 防舷材撤去                      | 1. 02        |
| 車止撤去                       | 1. 02        |
| 電気防食取付                     | 1. 02        |
| 防砂目地板取付工（陸上施工）             | 1. 02        |
| 防水目地板取付工（水中施工）             | 1. 02        |
| 吸出し防止工（陸上施工・海上施工）          | 1. 02        |
| 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）       | 1. 01        |
| ペトロラタム被覆                   | 1. 02        |
| 現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）      | 1. 02        |
| 現場鋼材溶接・切断工（水中施工）           | 1. 02        |

| 名称                            | 市場単価<br>補正係数 |
|-------------------------------|--------------|
| かき落とし工                        | 1.02         |
| 汚濁防止膜設置・撤去・移設                 | 1.01         |
| 汚濁防止枠設置・撤去                    | 1.01         |
| 灯浮標設置・撤去                      | 1.01         |
| 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検） | 1.00         |
| 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）        | 1.02         |
| 異形ブロック製作 型枠工                  | 1.02         |
| 異形ブロック製作 コンクリート打設工            | 1.02         |
| 異形ブロック製作 給熱養生                 | 1.01         |

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称                | 区分    | 補正係数 |
|-------------------|-------|------|
|                   |       | 現場閉所 |
|                   |       | 月単位  |
| 区画線工              |       | 1.02 |
| 高視認性区画線工          |       | 1.02 |
| 橋梁塗装工             |       | 1.01 |
| 構造物とりこわし工         | 機械    | 1.01 |
|                   | 人力    | 1.02 |
| コンクリートブロック積工      |       | 1.02 |
| 排水構造物工            |       | 1.02 |
| 鋼製排水溝設置工          |       | 1.02 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 固定足場  | 1.01 |
|                   | 高所作業車 | 1.01 |
| 表面含浸工             | 固定足場  | 1.02 |
|                   | 高所作業車 | 1.02 |
| 連続繊維シート補強工        | 固定足場  | 1.02 |
|                   | 高所作業車 | 1.02 |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）   | 固定足場  | 1.02 |
|                   | 高所作業車 | 1.02 |
| 漏水対策材設置工          | 固定足場  | 1.02 |
|                   | 高所作業車 | 1.02 |
| 防草シート設置工          |       | 1.01 |

| 名称                          | 区分    | 補正係数 |
|-----------------------------|-------|------|
|                             |       | 現場閉所 |
|                             |       | 月単位  |
| 紫外線硬化型 FRP シート設置工（ポリエルテル樹脂） | 固定足場  | 1.01 |
|                             | 高所作業車 | 1.01 |
| 塗膜除去工                       |       | 1.02 |
| バキュームブラスト工                  |       | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工                    | 設置    | 1.00 |
|                             | 撤去    | 1.02 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）          |       | 1.02 |
| 機械式継手工                      |       | 1.02 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工                  |       | 1.01 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工   |       | 1.01 |
| FRP 製格子状パネル設置工              |       | 1.00 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）         |       | 1.02 |
| 支承金属溶射工                     |       | 1.02 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工       |       | 1.02 |
| フレア溶接工                      |       | 1.02 |
| H 型ボラード設置工                  |       | 1.01 |
| 橋梁用水切り材設置工                  | 固定足場  | 1.02 |
|                             | 作業車   | 1.02 |

4. 【参考】週休2日制工事確認表

週休2日制工事 確認表

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| 工事名     | 〇〇道路改良工事 |             |
| 工期      | 令和7年7月1日 | ～ 令和7年9月30日 |
| 請負業者名   | A        |             |
| 現場代理人   | ああ       |             |
| 工事開始日   |          |             |
| 完成報告提出日 |          |             |
| 元請負     | A ああ     |             |
| 従事期間    | 令和7年7月1日 | ～ 令和7年9月30日 |

工事概要で設定した期間外が入力されています。

確認シートA移動

| 令和7年7月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考<br>出勤曜日、休日、一時対象外 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |                     |
| 計画     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |
| 実績     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |
| 備考     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |

| 令和7年8月 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 備考<br>出勤曜日、休日、一時対象外 |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
|        | 1<br>金 | 2<br>土 | 3<br>日 | 4<br>月 | 5<br>火 | 6<br>水 | 7<br>木 | 8<br>金 | 9<br>土 | 10<br>日 | 11<br>月 | 12<br>火 | 13<br>水 | 14<br>木 | 15<br>金 | 16<br>土 | 17<br>日 | 18<br>月 | 19<br>火 | 20<br>水 | 21<br>木 | 22<br>金 | 23<br>土 | 24<br>日 | 25<br>月 | 26<br>火 | 27<br>水 | 28<br>木 | 29<br>金 | 30<br>土 |                     | 31<br>日 |
| 計画     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |         |
| 実績     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |         |
| 備考     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |         |

| 令和7年9月 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 備考<br>出勤曜日、休日、一時対象外 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
|        | 1<br>月 | 2<br>火 | 3<br>水 | 4<br>木 | 5<br>金 | 6<br>土 | 7<br>日 | 8<br>月 | 9<br>火 | 10<br>水 | 11<br>木 | 12<br>金 | 13<br>土 | 14<br>日 | 15<br>月 | 16<br>火 | 17<br>水 | 18<br>木 | 19<br>金 | 20<br>土 | 21<br>日 | 22<br>月 | 23<br>火 | 24<br>水 | 25<br>木 | 26<br>金 | 27<br>土 | 28<br>日 | 29<br>月 | 30<br>火 |                     |
| 計画     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |
| 実績     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |
| 備考     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |
