

4. 「月2回土日完全週休2日制試行工事（受注者希望型）」  
特記仕様書【漁港漁場関係工事】

- 1 月2回土日完全週休2日制の定義
  - (1) 月2回土日完全週休2日制試行工事の対象期間は、現場着手日から工事完成報告書の提出日までとする。
  - (2) 対象期間中、原則、「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日及び日曜日を現場休工日とする（下請負者を含む）。ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合で監督員との協議により現場休工日に工事現場を稼働させた時は、その後、4週間以内に振替を行うこと。
- 2 受注者は月2回土日完全週休2日制を実施するか否かについて、契約後10日以内に様式1を作成し、監督員へ提出すること。  
なお、実施する場合は、土日完全週休2日とする週を様式1にて報告すること。
- 3 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第21条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
- 4 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。  
また、土日完全週休2日とする週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。
- 5 対象期間中において、月2回土日完全週休2日を達成できた場合、対象期間内の現場閉所日数の割合に応じて、以下のとおり、それぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率）に補正係数を乗じて補正し、変更契約にて計上する。市場単価については、別表により補正する。  
なお、現場閉所日数は、あらかじめ決めた月2回の土曜日及び日曜日のほか、天候（降雨・降雪等）により休工した日も現場閉所日数としてカウントする。
  - 1 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（3日間）」、「年末年始休暇（6日間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事務等による不稼働期間」、「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期

間」は対象期間から除く。

2 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

【4週8休以上】

(現場閉所日数/対象期間日数：28.5%以上)

- ・労務費                    : 1 . 0 5     ・機械経費(賃料): 1 . 0 4
- ・共通仮設費率         : 1 . 0 2     ・現場管理費率     : 1 . 0 3

別表

市場単価の経費係数については下記の補正係数を乗じる。


|    |                            | 市場単価補正係数 |
|----|----------------------------|----------|
| 1  | 底面工                        | 1.04     |
| 2  | マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置) | 1.01     |
| 3  | 支保工                        | 1.05     |
| 4  | 足場工                        | 1.03     |
| 5  | 鉄筋工                        | 1.05     |
| 6  | 吊鉄筋工                       | 1.05     |
| 7  | 型枠工                        | 1.04     |
| 8  | コンクリート打設工(ポンプ車打設)          | 1.05     |
|    | コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)        | 1.05     |
| 9  | 止水板工                       | 1.05     |
| 10 | 上蓋工                        | 1.05     |
| 11 | 伸縮目地工                      | 1.03     |
| 12 | 係船柱取付                      | 1.05     |
| 13 | 防舷材取付                      | 1.05     |
| 14 | 車止・縁金物取付                   | 1.05     |
| 15 | 係船柱撤去                      | 1.05     |
| 16 | 防舷材撤去                      | 1.05     |
| 17 | 車止撤去                       | 1.05     |
| 18 | 電気防食取付                     | 1.05     |
| 19 | 防砂目地板取付工(陸上施工)             | 1.05     |
| 20 | 防砂目地板取付工(水中施工)             | 1.04     |
| 21 | 吸出し防止工(陸上施工・海上施工)          | 1.04     |
| 22 | 港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)       | 1.04     |

|    |                               |      |
|----|-------------------------------|------|
| 23 | ペトロラタム被覆                      | 1.05 |
| 24 | 現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）         | 1.05 |
| 25 | 現場鋼材溶接・切断工（水中施工）              | 1.05 |
| 26 | かき落とし工                        | 1.05 |
| 27 | 汚濁防止膜設置・撤去・移設                 | 1.04 |
| 28 | 汚濁防止枠設置・撤去                    | 1.03 |
| 29 | 灯浮標設置・撤去                      | 1.04 |
| 30 | 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検） | 1.01 |
|    | 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）        | 1.05 |
| 31 | 異形ブロック製作 型枠工                  | 1.05 |
|    | 異形ブロック製作 コンクリート打設工            | 1.05 |

6 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」 が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課、若しくは、三重県建設業協会本部及び各支部

【掲示の例・サイズ】A 3 横サイズ(297×420mm)

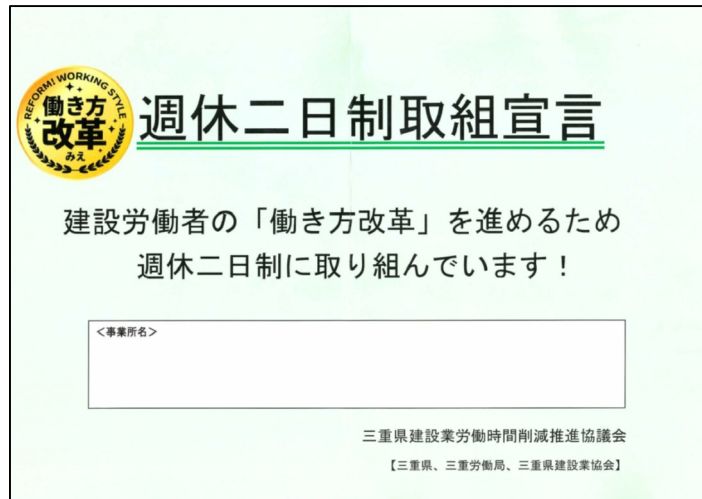

建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

月 2 回土日完全週休 2 日制工事（受注者希望型）

月 2 回土日完全週休 2 日の実施について

以下のいずれかを にしてください。

：当社は月 2 回土日完全週休 2 日を実施します。

月 2 回の土日完全週休 2 日とする週を

「第 1、3 週」

「第 2、4 週」

第 、 週」とします。

：当社は以下の理由により、土日完全週休 2 日を実施しません。

（実施しない場合、該当する理由を ■ にしてください。複数回答可）

- 工程管理が困難となるから（天候不順など不確定な要素を除く）
- 天候不順など不確定な要素があることで工程管理が困難となるから
- 日給月給制の従業員が多く、月当たりの賃金が低くなるから
- 工期が延びることから工事経費が通常の工事より多く必要となるから
- 当社の休暇制度と合わないから
- 下請業者との調整が困難となるから
- 他工事との調整が困難となるから
- その他

（

）

令和 年 月 日

工事名

会社名

現場代理人
