

## 第2編 森林整備保全工事編

### 1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。このため、週休2日（4週8休）の普及に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事（以下「週休2日」という。）とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%）に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）を達成しているものとみなす。（別紙2の①）

3 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く。

- ・ 準備期間
- ・ 後片付け期間
- ・ 夏季休暇（3日間）
- ・ 年末年始休暇（6日間）
- ・ 工場製作のみの期間
- ・ 工事事務等による不稼働期間
- ・ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・ その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、月単位の週休2日の場合において発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った日、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。（別紙2の②、③）

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（対象工事）

第3条 すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。

- ① 契約工期が、50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型（月単位））」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 当初設計における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1の①、③、④）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

2 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数（別紙1の②、③、④）に減額変更するものとする。

また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正分を減額変更するものとする。

3 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

なお、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日の月で現場閉所日数を算定すること。

4 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

（工事成績評定における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日に振替えることができるが、工事成績評定の加点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日への振替えの場合

とする。（別紙２の④）

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所、月単位及び通期の週休２日が達成出来なかった場合でも、工事成績評定の減点は行わない。

（交替制への変更）

第７条 現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休２日（現場閉所）から週休２日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休２日（交替制）に変更した場合、週休２日制工事試行要領 第２編 森林整備保全工事編「週休２日交替制工事（発注者指定型）試行要領」に基づき実施するものとする。

（その他）

第８条 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※３が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示例・サイズ】Ａ３横サイズ（２９７×４２０ｍｍ）

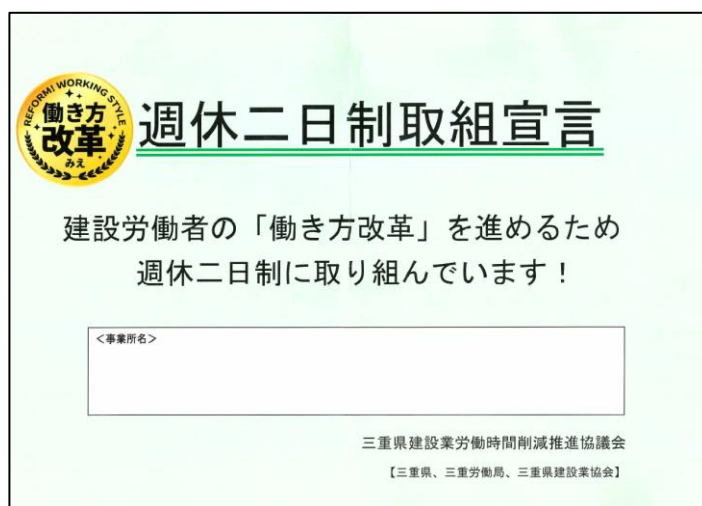

【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

[https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039\\_00002.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm)

【三重労働局ダウンロードページ】

<https://jsite.mhlw.go.jp/mie->

[roudoukyoku/hourei\\_seido\\_tetsuzuki/roudouki\\_jun\\_keiyaku/densisinsei\\_00001.html](roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudouki_jun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

・ 直接受け取る場合

【配付先】 厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・ 郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

附則 この要領は、令和元年7月1日から施行する。

附則 この要領は、令和2年5月1日から施行する。

附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

附則 この要領は、令和4年6月1日から施行する。

附則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和5年7月1日から施行する。

附則 この要領は、令和6年7月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年7月1日から施行する。

## 【別紙１ 補正係数】

## ① 月単位の週休２日（４週８休以上）

- ・ 労務費 : 1. 04
- ・ 機械経費（賃料）: 1. 02
- ・ 共通仮設費率 : 1. 03
- ・ 現場管理費率 : 1. 05

## ② 通期の週休２日（４週８休以上）

- ・ 労務費 : 1. 02
- ・ 機械経費（賃料）: 1. 02
- ・ 共通仮設費率 : 1. 02
- ・ 現場管理費率 : 1. 03

## 森林整備保全工事

## ③ 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称               | 区分    | 補正係数  |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  |       | 月単位   | 通期    |
| 鉄筋工（太径鉄筋を含む）     |       | 1. 04 | 1. 02 |
| 鉄筋工（ガス圧接）        |       | 1. 03 | 1. 02 |
| 防護柵設置工（ガードレール）   | 設置    | 1. 01 | 1. 00 |
|                  | 撤去    | 1. 04 | 1. 02 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置    | 1. 04 | 1. 02 |
|                  | 撤去    | 1. 04 | 1. 02 |
| 防護柵設置工（落石防護柵）    |       | 1. 01 | 1. 01 |
| 防護柵設置工（落石防止網）    |       | 1. 02 | 1. 01 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ）   | 設置    | 1. 01 | 1. 00 |
|                  | 撤去    | 1. 04 | 1. 02 |
| 道路標識設置工          | 設置    | 1. 01 | 1. 00 |
|                  | 撤去・移設 | 1. 03 | 1. 02 |
| 道路付属物設置工         | 設置    | 1. 01 | 1. 01 |
|                  | 撤去    | 1. 04 | 1. 02 |
| 法面工              |       | 1. 02 | 1. 01 |
| 吹付砕工             |       | 1. 03 | 1. 01 |
| 軟弱地盤処理工          |       | 1. 02 | 1. 01 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工）   |       | 1. 03 | 1. 02 |
| 橋梁用伸縮接手装置設置工     |       | 1. 02 | 1. 01 |
| 橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工  |       | 1. 04 | 1. 02 |

④ 土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する  
補正係数

| 名称                  | 区分 | 補正係数 |      |
|---------------------|----|------|------|
|                     |    | 月単位  | 通期   |
| 区画線工                |    | 1.04 | 1.02 |
| 構造物とりこわし工           | 機械 | 1.03 | 1.02 |
|                     | 人力 | 1.04 | 1.02 |
| コンクリートブロック積工        |    | 1.04 | 1.02 |
| 排水構造物工              |    | 1.04 | 1.02 |
| 橋梁塗装工               |    | 1.03 | 1.01 |
| 塗膜除去工               |    | 1.04 | 1.02 |
| 道路反射鏡設置工            | 設置 | 1.01 | 1.00 |
|                     | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 侵食防止用植生マット工(養生マット工) |    | 1.04 | 1.02 |

## 【別紙2 月単位の週休2日の考え方】

月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。

- ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。（A月、B月）

| A月（パターンA） |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 月         | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30 |    |    |    |    |    |

- ・ A月すべてが対象期間の場合

$$\frac{8 \text{ 日（土日日数）}}{30 \text{ 日（対象日数）}} = 26.6\% \dots$$

4週8休に満たないが、A月は8日以上  
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

| B月（パターンB） |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 月         | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30 |    |    |    |    |    |

- ・ B月22日から対象期間が始まる場合

$$\frac{2 \text{ 日（土日日数）}}{9 \text{ 日（対象日数）}} = 22.2\% \dots$$

4週8休に満たないが、B月は2日以上  
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

- ② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。  
（C月）

| C月（パターンC） |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 月         | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30 |    |    |    |    |    |

- ・ C月4日で対象期間が終わる場合
- ・ C月29日から対象期間が始まる場合



暦上の土日を含まないため、対象期間から除く

- ③ 同一週での指示による土日作業は対象期間から除く。

| D月（パターンD） |           |    |    |    |            |    |
|-----------|-----------|----|----|----|------------|----|
| 月         | 火         | 水  | 木  | 金  | 土          | 日  |
| 1         | 2         | 3  | 4  | 5  | 6          | 7  |
| 8         | 9         | 10 | 11 | 12 | 13         | 14 |
| 15        | 16<br>指示日 | 17 | 18 | 19 | 20<br>緊急対応 | 21 |
| 22        | 23        | 24 | 25 | 26 | 27         | 28 |
| 29        | 30        |    |    |    |            |    |

- ・ D月 16 日の指示で D月 20 日に緊急対応を行った場合



緊急対応の作業日を除いた土日日数の現場閉所を行ってれば、4週8休以上の達成とみなす

土日日数 8 日 ⇒ 土日日数 7 日  
緊急対応除く

※ 月単位及び工事成績評定において、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った日は、対象期間から除く。

- ④ 土曜日・日曜日をやむを得ず振替える場合（E月、F月）

| 【同じ月への振り替え】 |    |    |    |    |    |    | 【他の月への振り替え】 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|
| E 月         |    |    |    |    |    |    | F 月         |    |    |    |    |    |    |
| 月           | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月           | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8           | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8           | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22          | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22          | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29          | 30 |    |    |    |    |    | 29          | 30 |    |    |    |    |    |

- ・ E 月の現場閉所日としてみなす

- ・ F 月の現場閉所日としてみなす  
（E 月の現場閉所日としない）

※ E 月の 4 週 8 休以上の率算出時に注意

【工事成績評定の加点】

振替え対象となる土曜日・日曜日から、原則、前後 2 週間以内の平日への振替えの場合とする。

2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表

土日完全週休2日制工事 確認表

対象期間内のすべての土日を指定土日として  
記入する

|       |  |
|-------|--|
| 請負業者名 |  |
| 現場代理人 |  |

|       |          |   |           |  |  |  |  |  |  |         |
|-------|----------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 工事名   |          |   |           |  |  |  |  |  |  |         |
| 工期    | 令和7年7月4日 | ～ | 令和7年9月10日 |  |  |  |  |  |  |         |
| 工事開始日 |          |   |           |  |  |  |  |  |  | 完成報告提出日 |

判定 週休2日 ・月単位の週休2日 ×  
・通期（対象期間全体）の週休2日 ×  
・指定土日（成績加点） ×

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

令和7年7月

|    |     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数   | 閉所率  | 4週8休<br>判定 | 指定土日<br>現場閉所 | 成績<br>加点                                                               | 備考 |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|    |     | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 0    | 0.0% | 対象外        | ／            |                                                                        |    |
| 計画 | 対象日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  | 0.0% | 対象外  | ／          |              | 準○準備期間、片○後片付期間、夏○夏休み期間、年○年末年始休み期間、<br>製○工場製作期間、○○対象期間、●○閉所指定土日、○○閉所予定日 |    |
|    | 閉所日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  | 0.0% | 対象外  | ／          |              |                                                                        |    |
| 実績 | 対象日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  | 0.0% | 対象外  | 対象外        |              | 事○工事事故等による不稼働期間、災○天災に対する突発的な対応期間、<br>他○その他、変○注者の真によりならない休工、●○閉所日       |    |
|    | 閉所日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  | 0.0% | 対象外  | 対象外        |              |                                                                        |    |
| 備考 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |            |              | 指定○現場閉所指定日、振替○指定日の振替日<br>開始○工事開始日、完成○修繕告書提出日                           |    |
|    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |            |              |                                                                        |    |

令和7年8月

|    |     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 閉所率  | 4週8休<br>判定 | 指定土日<br>現場閉所 | 成績<br>加点 | 備考                                                        |                                                                    |     |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|    |     | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 0  | 0.0% | 対象外        | ／            | ／        |                                                           |                                                                    |     |
| 計画 | 対象日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |            |              |          |                                                           | 準○準備期間、片○後片付期間、夏○夏休み期間、年○年末年始休み期間、製○工場製作期間、○○対象期間、●○閉所指定土日、○○閉所予定日 |     |
|    | 閉所日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |            |              |          | 事○工事事故等による不稼働期間、災○天災に対する突発的な対応期間、他○その他、変注者の責によらない休工、●○閉所日 |                                                                    |     |
| 実績 | 対象日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |            |              |          | 対象外                                                       | 対象外                                                                | 対象外 |
|    | 閉所日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |            |              |          |                                                           | 指定○現場閉所指定日、振替日                                                     |     |
| 備考 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |            |              |          | 開始○工事開始日、完成○学研報告書提出日                                      |                                                                    |     |

計画時の確認

|        |   |
|--------|---|
| 対象予定日数 | 0 |
| 閉所予定日数 | 0 |
| 達成予定率  |   |

実績の確認

|      |   |
|------|---|
| 対象日数 | 0 |
| 閉所日数 | 0 |
| 達成率  |   |

通期（対象期間全体）の週休2日の状況
